

令和5年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果 (A等級)

○調査対象工事

北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事の内、請負金額2,500万円以上(建築は3,000万円以上)でかつ、令和5年4月1日～令和6年3月31日までに完成し採算が把握できる工事。


※採算性には本社経費を含めたもの

○対象企業 会員企業のうち県ランク土木A等級または、建築A等級 151社


○回答企業数 108社 回答率 71.5%

○調査期間 令和6年6月3日～7月9日


①調査対象工事の状況 (548件、108社)

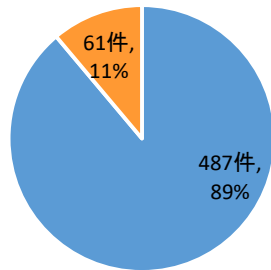


②赤字工事の内訳 (61件、30社)

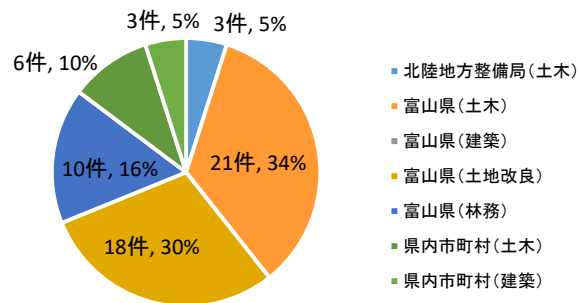

③発注者別の採算状況 (548件、108社)

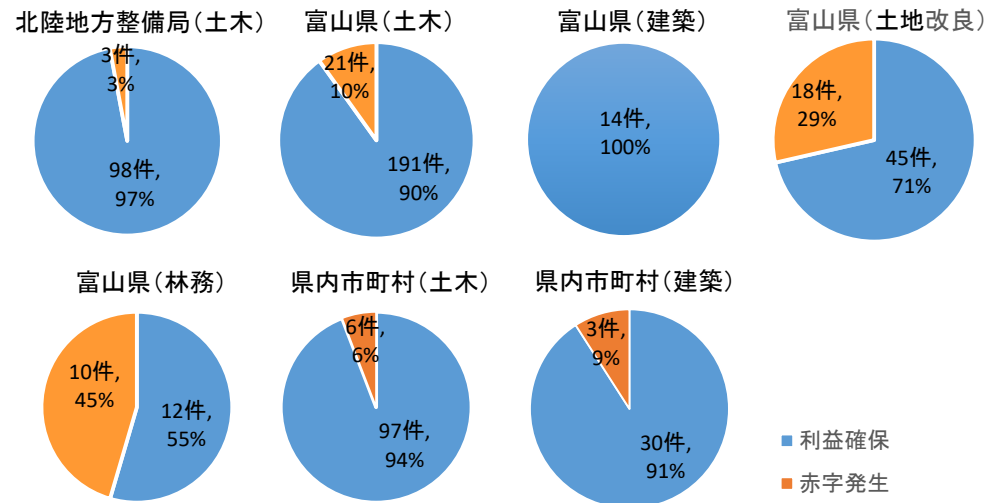


④赤字工事の主な発生理由 (3つまで回答可)

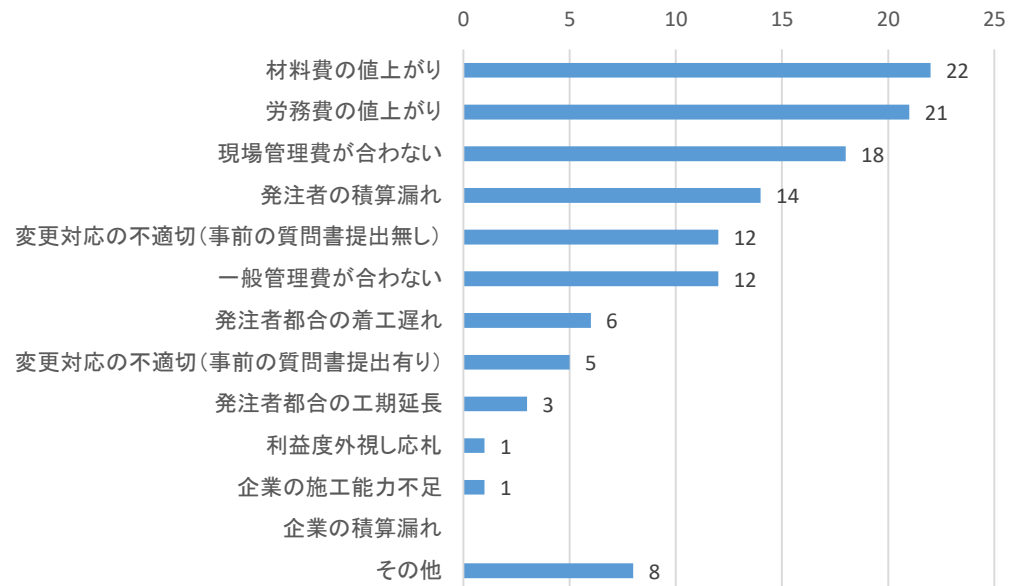


令和5年度 発注者別赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)


北陸地方整備局(土木) 利益確保98件(97%) 赤字発生3件(3%)

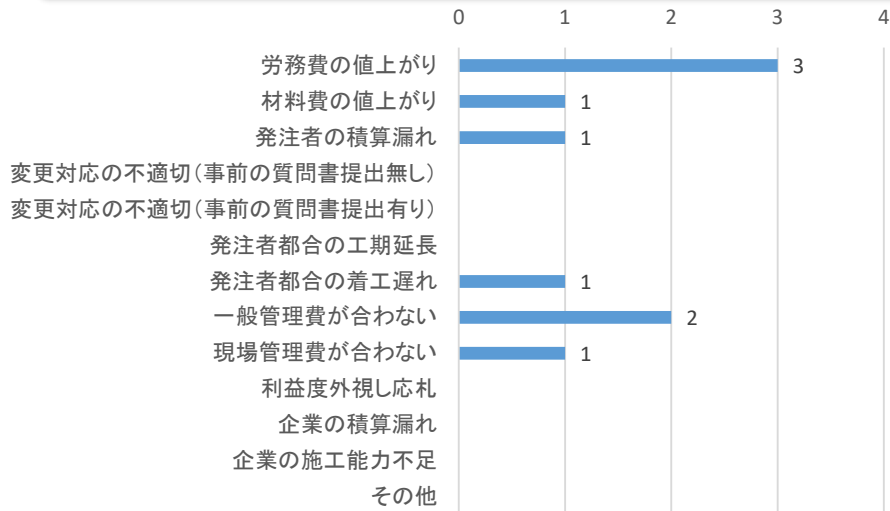


富山県(土木) 利益確保191件(90%) 赤字発生21件(10%)

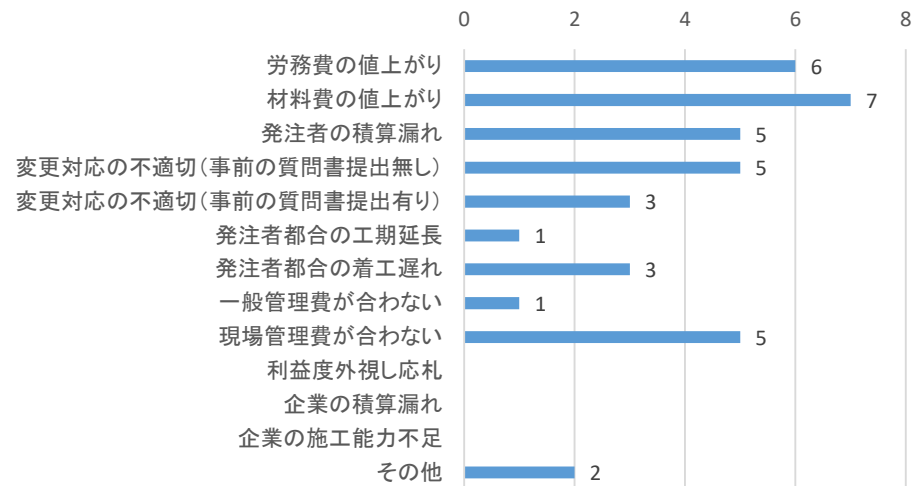


富山県(土地改良)利益確保45件(71%) 赤字発生18件(29%)

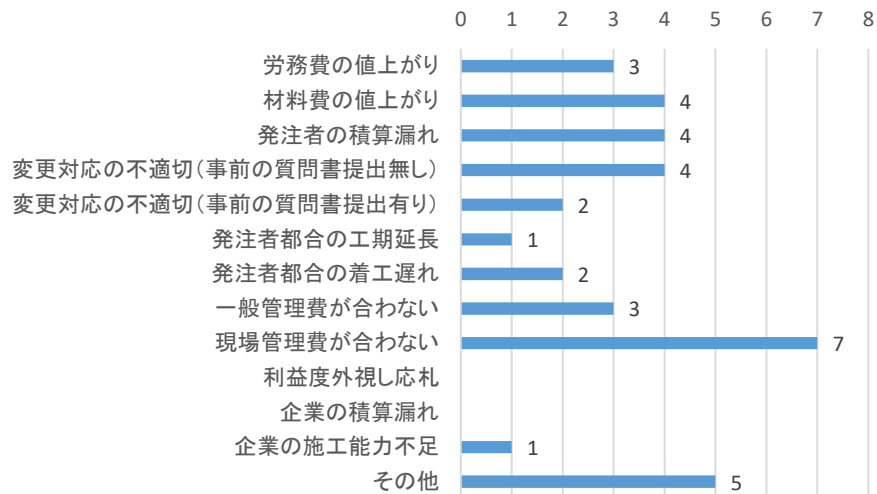


富山県(林務) 利益確保12件(55%) 赤字発生10件(45%)

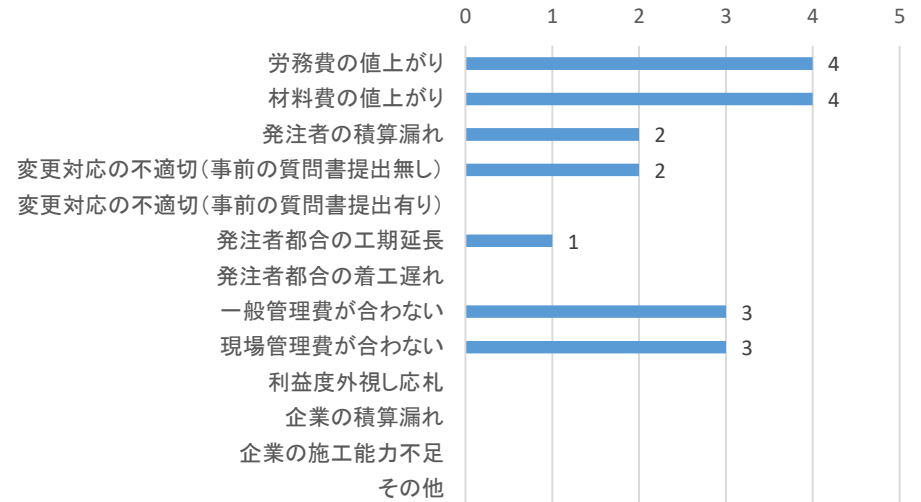

県内市町村(土木) 利益確保97件(94%) 赤字発生6件(6%)

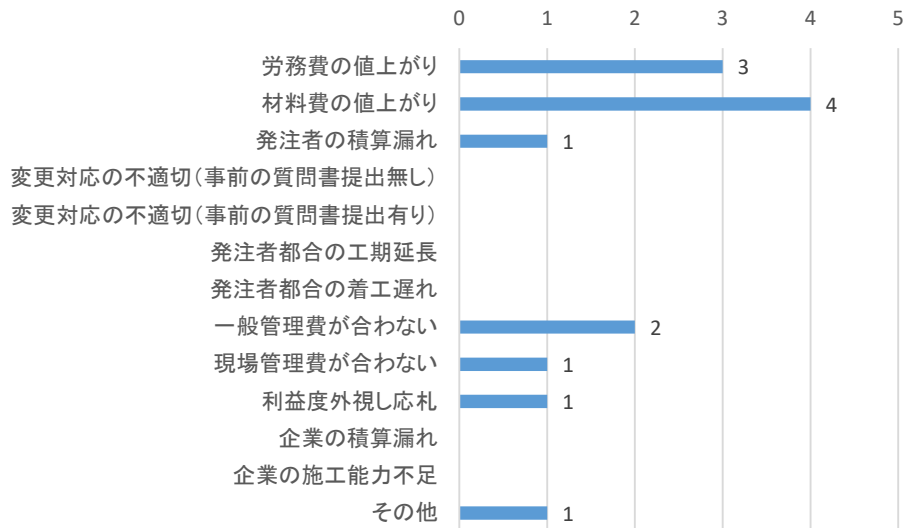

県内市町村(建築) 利益確保30件(91%) 赤字発生3件(9%)

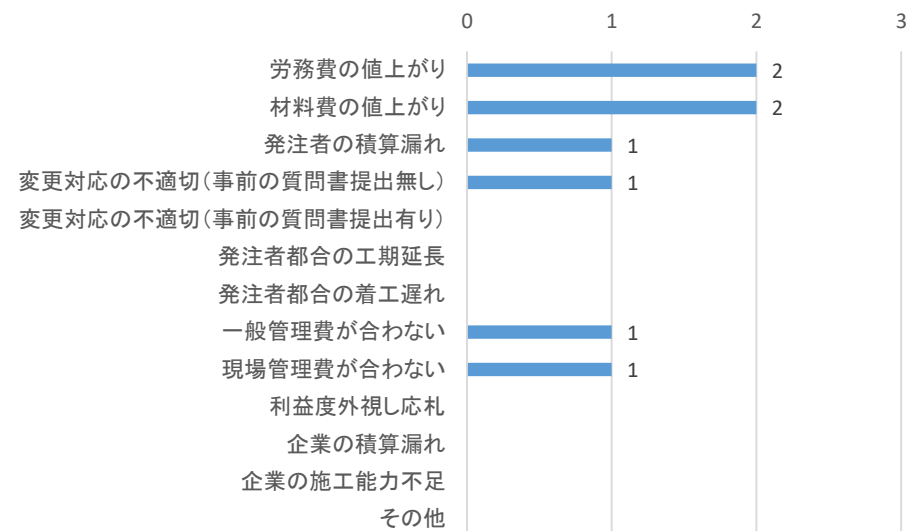

赤字工事の主な発生理由(その他)

【富山県(土木)】

- ・施工に必要な仮設費を変更対象として対応してもらえなかった。
- ・施工規模が小さくて労務費と機械経費が増大したため。

【富山県(土地改良)】

- ・自然災害(大雨による出水)で手戻りが生じたため。
- ・施工箇所が複数に点在する専門性が高い工種がメインの工事であったため、施工機械の移動費用や作業員のロスが多くなり、設計金額と外注業者の見積金額に大きな乖離が生じた。排水路整備工事で、施工基面から掘削面までの深さが深く、湧水も多く土質が軟弱であったため、作業員や機械損料に大きなロスが生じた。採算性の点から、用水路と同じ施工歩掛で排水路工事を行うことは非常に厳しい。
- ・冬季の施工のため。
- ・農地系の積算自体(歩掛)に問題がある。

【市町村(土木)】

- ・発注者の予算不足のため。

発注者別工事採算性に関するアンケート結果（令和4年度と令和5年度の比較）

①調査対象工事の状況（令和4年度 644件 115社、令和5年度 548件 108社）

調査対象工事


・北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事のうち、請負金額2,500万以上（建築3,000万円以上）

<令和4年度対象工事期間>


令和4年4月1日～令和5年3月31日

<令和5年度対象工事期間>


令和5年4月1日～令和6年3月31日

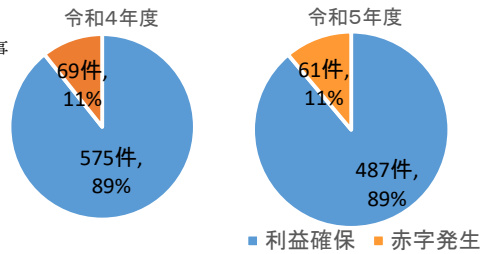



②赤字工事の内訳（令和4年度 69件 45社、令和5年度 61件 30社）

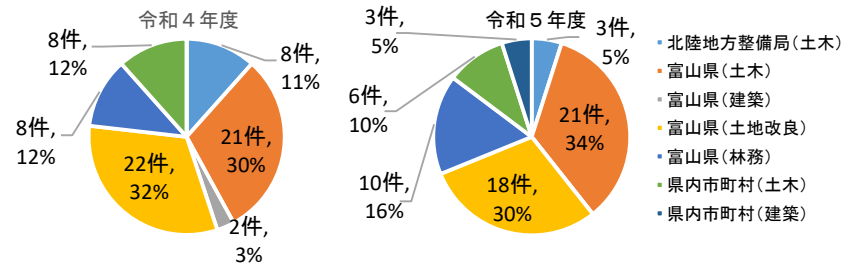

③発注者別の採算状況

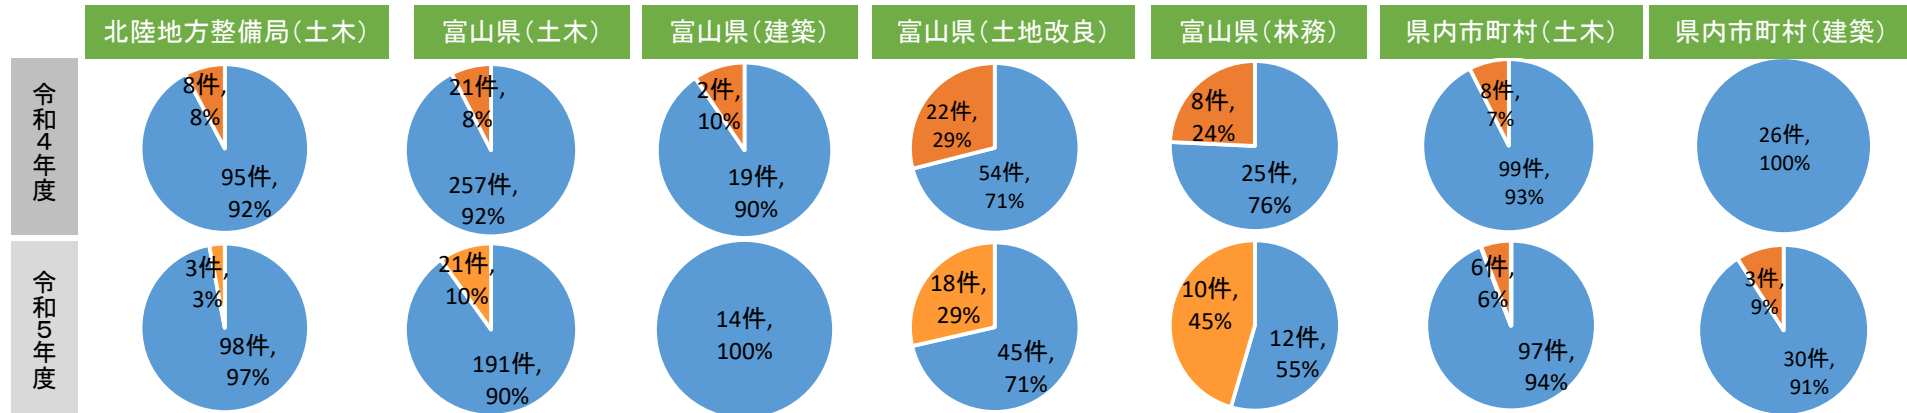


④赤字工事の主な発生理由（3つまで回答可）

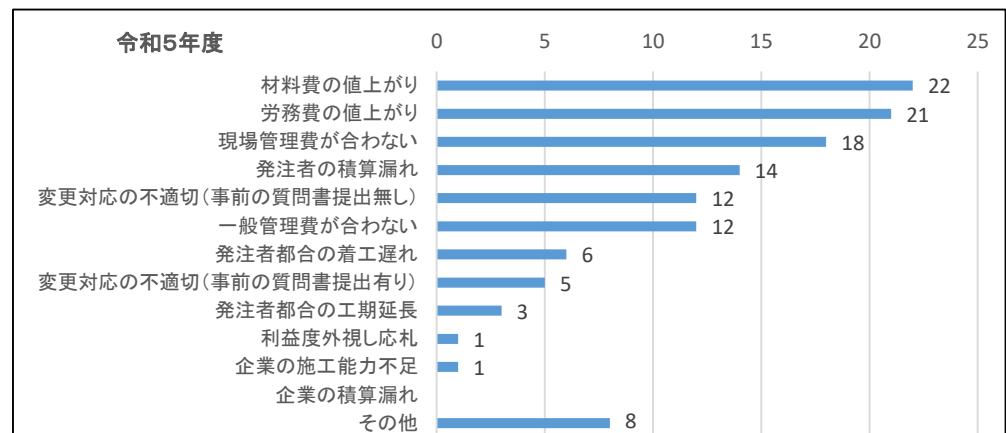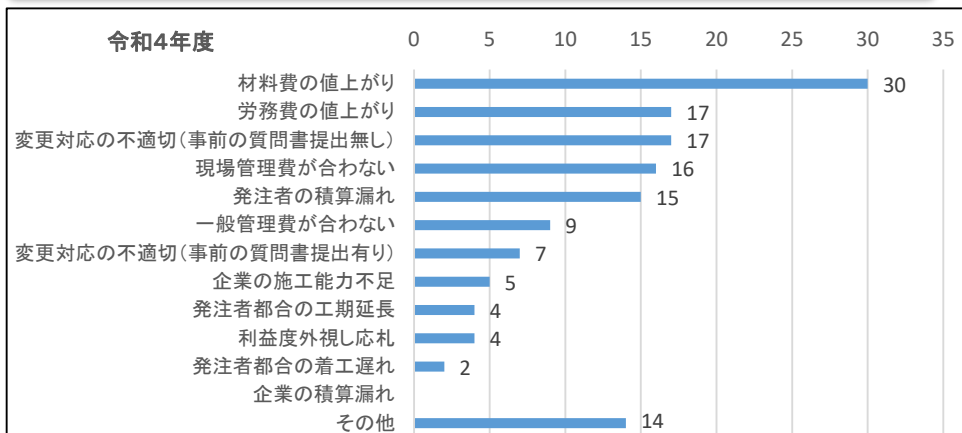


令和5年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果(呉東呉西の比較)


①調査対象工事の状況(呉東 253件、53社, 呉西 295件、55社)

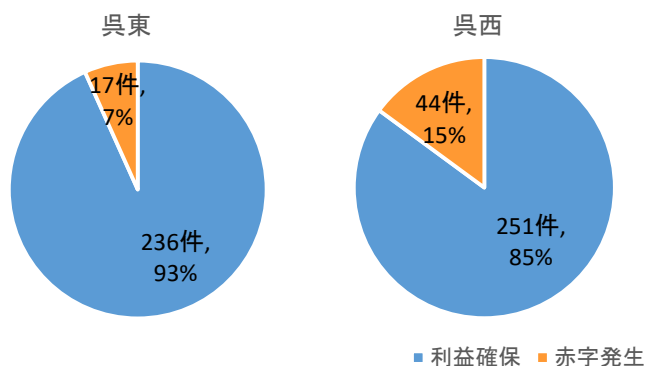


③発注者別の採算状況(548件、108社)

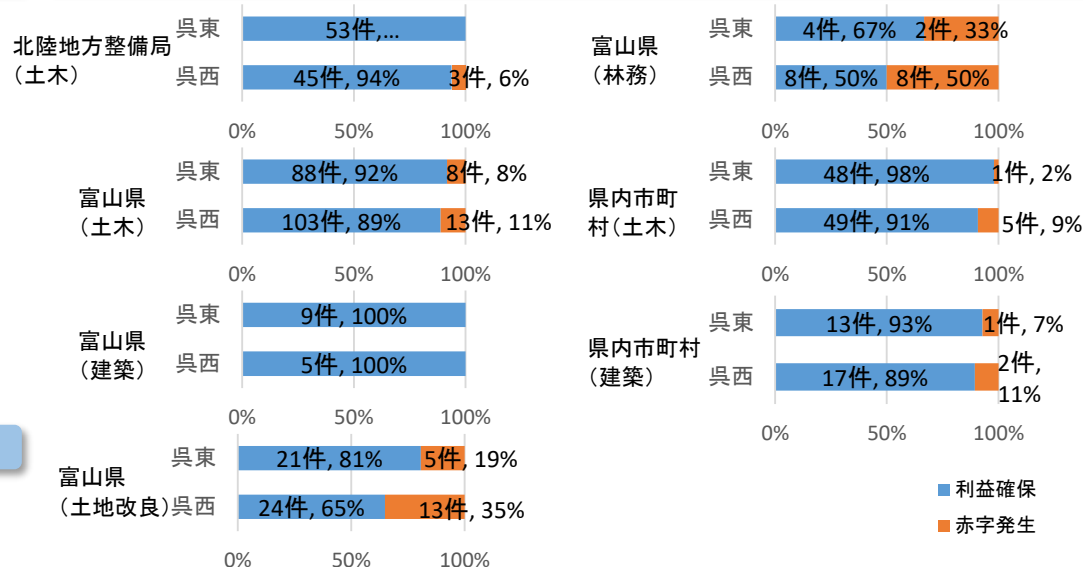

②赤字工事の内訳(呉東 17件、12社, 呉西 44件、18社)

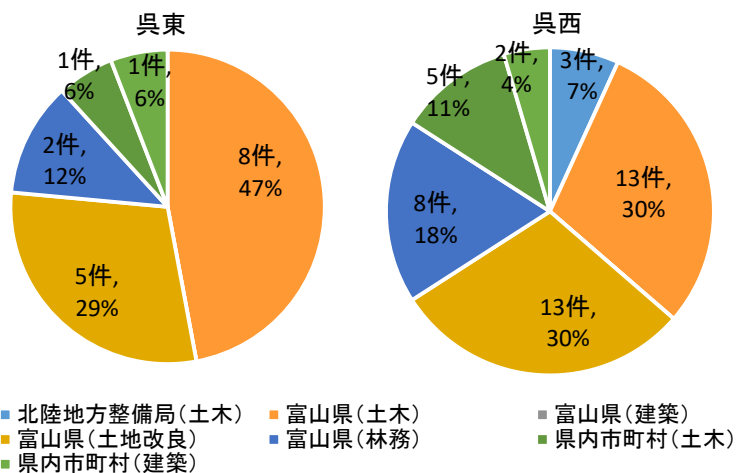

④赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)

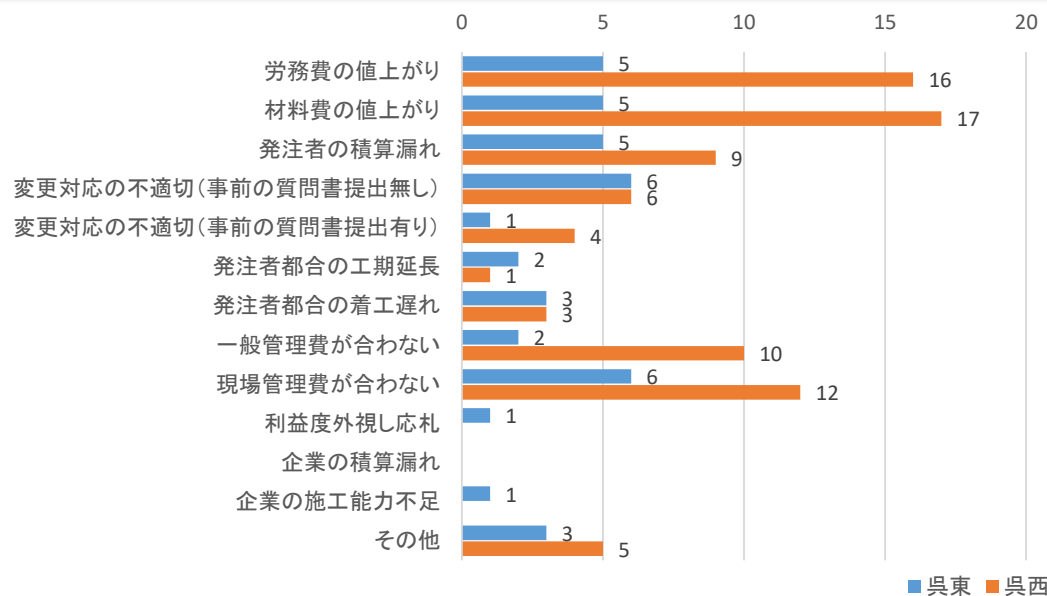


令和5年度 発注者別赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)(呉東呉西の比較)


北陸地方整備局(土木) 赤字発生 呉東 0件、呉西 3件




富山県(土木) 赤字発生 呉東 8件、呉西 13件

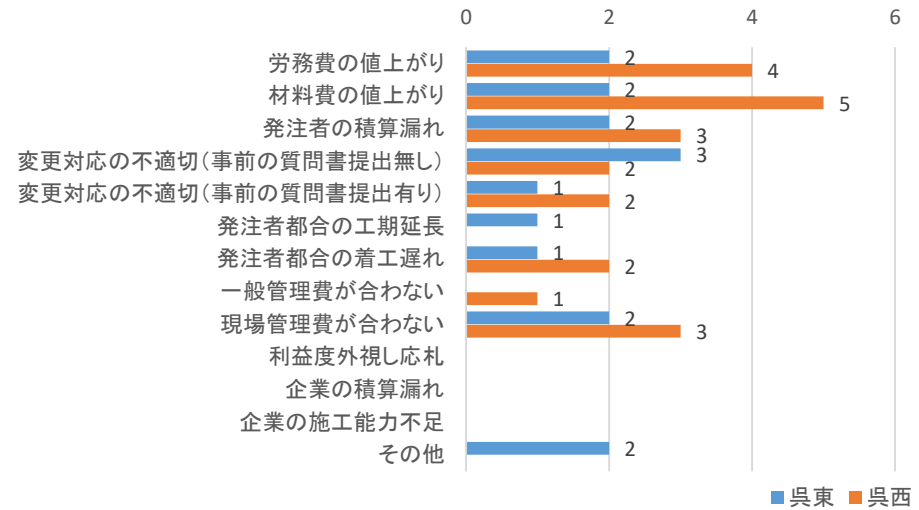


富山県(土地改良) 赤字発生 呉東 5件、呉西 13件

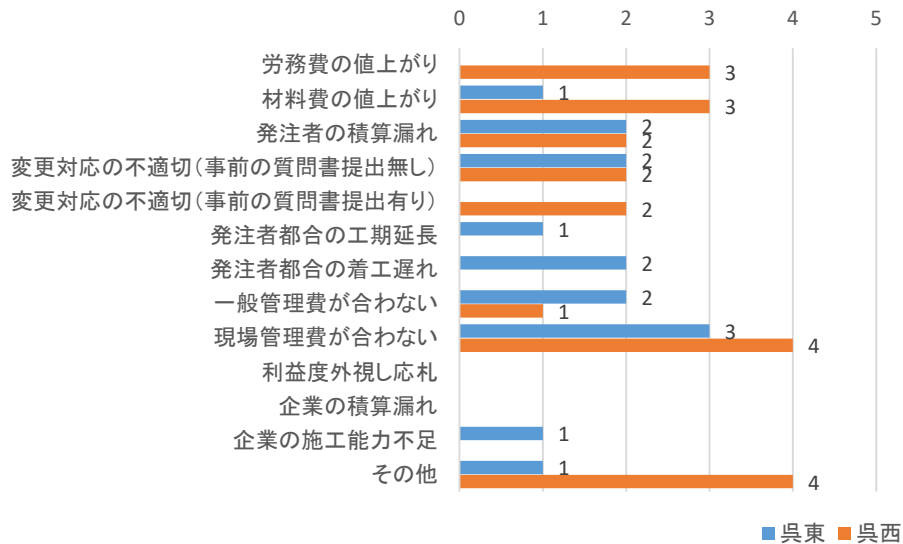


富山県(林務) 赤字発生 呉東 2件、呉西 8件

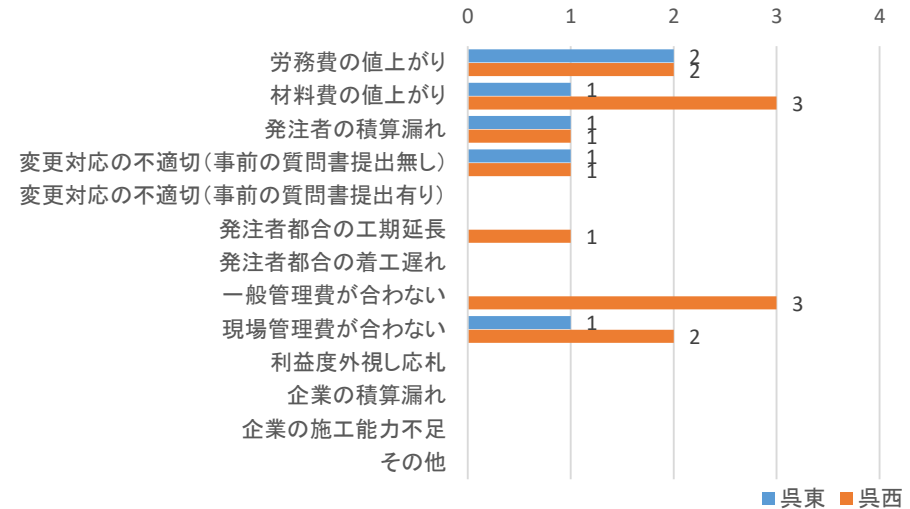

県内市町村(土木) 赤字発生 呉東 1件、呉西 5件

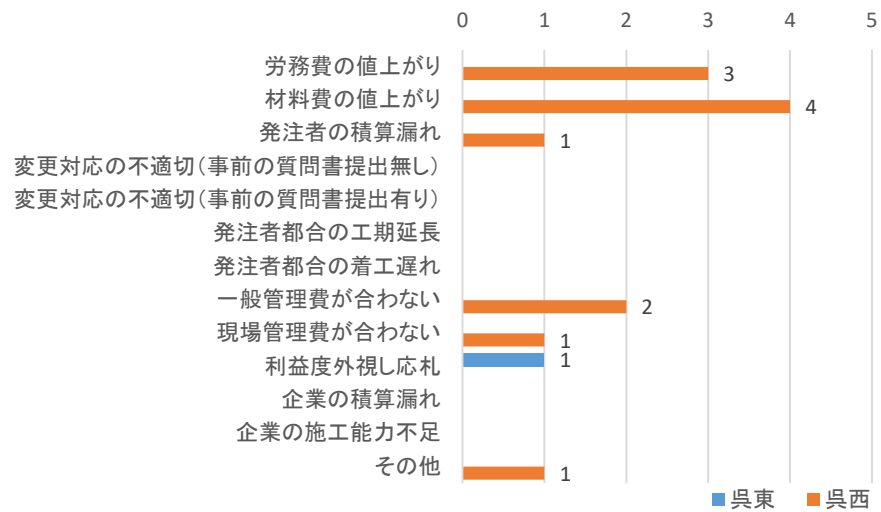


県内市町村(建築) 赤字発生 呉東 1件、呉西 2件

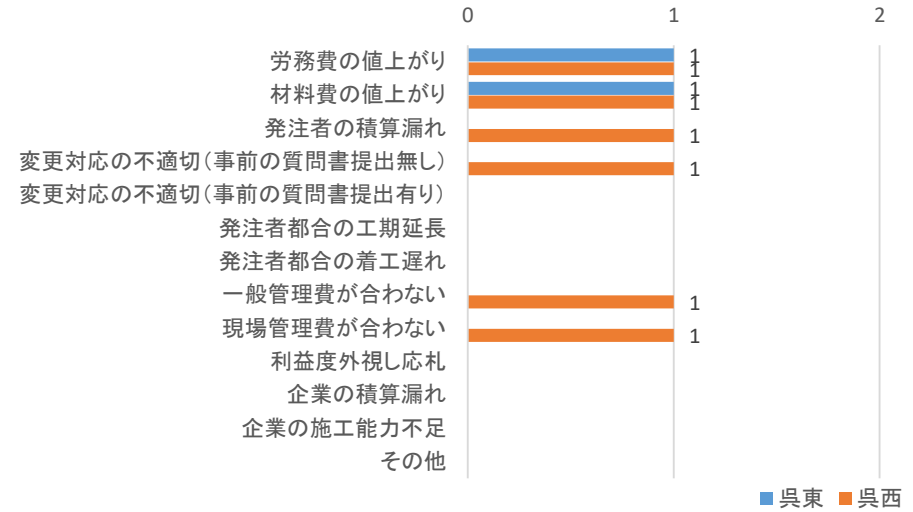


発注者別工事採算性に関するアンケート結果(令和4年度と令和5年度の呉東呉西比較)

①発注者別の採算状況


北陸地方整備局(土木)

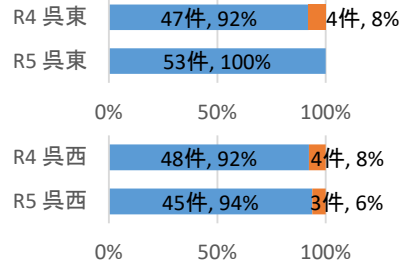


富山県(土木)

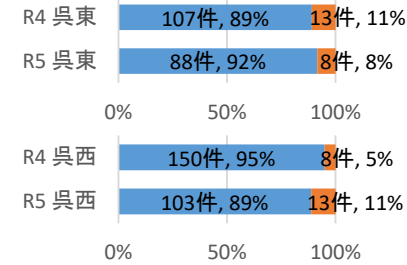


富山県(建築)

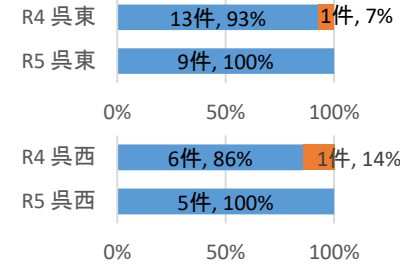


富山県(土地改良)

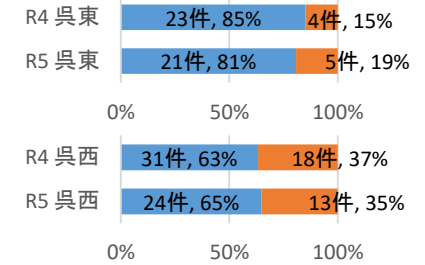


富山県(林務)

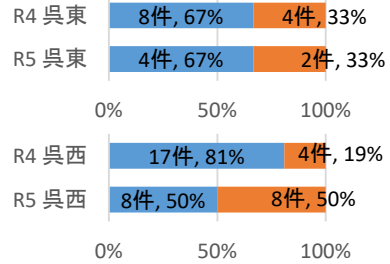

県内市町村(土木)

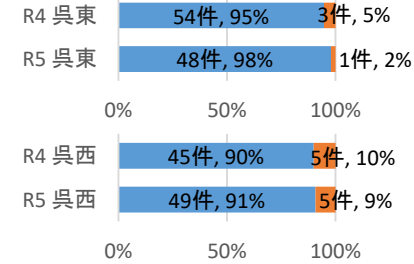


県内市町村(建築)

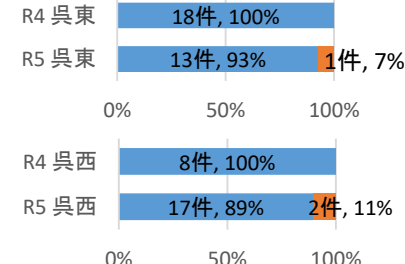


■ 利益確保
■ 赤字発生

②赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)


労務費の値上がり




材料費の値上がり



発注者の積算漏れ



変更対応の不適切




※事前の質問書提出有り、無しの合算


発注者都合の工期延長




発注者都合の着工遅れ




一般管理費が合わない




現場管理費が合わない




利益度外視し応札



企業の施工能力不足



その他



■ R4 ■ R5
